



REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL FORMATQ N° 12-B

SECCIONES DEL FORMATO N° 12-B:



1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN

CÓDIGO ÚNICO:	2355763	TIPO DE INVERSIÓN:	PROYECTO DE INVERSIÓN
NOMBRE DE LA INVERSIÓN:	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LAS CUENCAS ALTAS DE LOS RÍOS YAUCA, TINGUE Y SANTA CRUZ, EN LOS DISTRITOS DE YAUCA DEL ROSARIO Y TIBILLO II ETAPA - PROVINCIAS DE ICA Y PALPA - REGIÓN ICA, LAS PROVINCIAS DE ICA Y PALPA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
OPMI:	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL ICA	REGISTRO DE CIERRE:	NO
UEI:	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA	PMI AÑO 1 <2025>	6,777,394
		PMI AÑO 2 <2026>	0
		PMI AÑO 3 <2027>	0

2. FOTOGRAFÍAS





JUN-2024




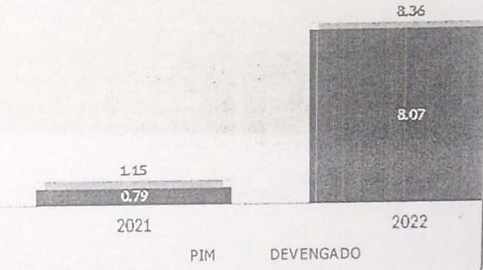
MAY-2024

3. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN

FECHA DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		VARIACIONES DEL COSTO ACTUALIZADO (S/ MM)		
INICIO:	15/06/2021	ÚLTIMA MODIFICACIÓN		
CULMINACIÓN:	15/07/2025	DECLARACIÓN DE VIABILIDAD	APROBACIÓN DEL 1er ET/DE	
AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN (I)  39.2%		AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA INVERSIÓN (I)  43.1%		
		22.3 MM	23.8 MM	32.5 MM
		OCT-2018	MAY-2021	JUL-2023
		Variación		Porcentaje (%)
		Respecto a la viabilidad		46% (S/ 10.3 MM)
Fecha de declaración: 24/05/2024 VER DETALLE DEL AVANCE: 				
SITUACIÓN [13/08/2024] La obra inició su ejecución física el 15/06/2021; el plazo de ejecución de obra actualizado es de: 780 días calendario; los principales trabajos ejecutados en el periodo fueron: LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE TROCHA CARROZABLE, INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y GEOMEMBRANA; el avance físico reportado en el presente periodo es de: 0.23%, el avance físico ejecutado acumulado es de: 40%, debe indicarse que el avance físico programado acumulado es de: 40.71%, la problemática de la obra es: FALTA DE ASIGNACIÓN FINANCIERA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PARALIZACIÓN PARCIAL DESDE EL 1ERO DE MAYO DE 2024, MANTENIENDOSE SOLO PERSONAL EN VIVEROS PARA EL REGADO DE LOS PLANTONES DE PINO, PARA QUE ESTOS NO MUERAN. ; Las acciones pendientes son: REALIZAR LA TRANSFERENCIA FINANCIERA Y REINICIAR EL PROYECTO  				
PROBLEMÁTICA - RIESGO EN LA FASE DE EJECUCIÓN				
Etapa ET/DE: 11/05/2023: OTROS				
 Etapa Proceso de ejecución física: 2021-10: DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES				
				

4. EJECUCIÓN FINANCIERA

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE LA INVERSIÓN

COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO:		S/	% DE AVANCE ACUMULADO	HISTÓRICO DEL DEVENGADO DE LA INVERSIÓN (S/ MM)	
32,612.149			 0%		
DEVENGADO ACUMULADO:		S/ 0			
PRIMER DEVENGADO:		FEB-2021			
ULTIMO DEVENGADO:		DIC-2022			

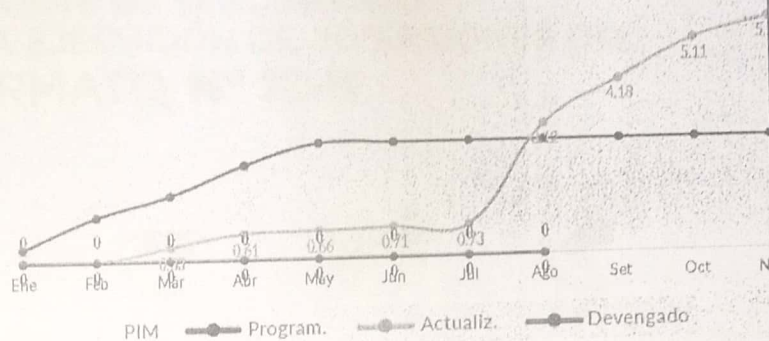
AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSIÓN 2024

PIM 2024 (a): S/ 0
 DEVENGADO 2024 : S/ 0
 PROGRAMACION FINANCIERA ACTUALIZADA (b): S/ 6,073,082
 DEFICIT O SALDO (a-b): S/ -6,073,082

PROGRAMACIÓN FINANCIERA ACUMULADA (S/ MM)

% DE AVANCE PIM 2024

NaN%



EJECUCIÓN FINANCIERA 2024 (S/)

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
Prog. Financ. Inicial	319,481	737,039	489,772	693,901	500,796	-	-	-	-	-	-	-	2,740,989
Prog. Financ. Actualizada	-	-	334,099	275,072	48,000	51,448	18,500	2,397,438	1,051,215	930,448	483,588	483,274	6,073,082
Devengado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

ENLACES DE INTERES:

