



REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL FORMATO N° 12-B

SECCIONES DEL FORMATO N° 12-B:



1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| CÓDIGO ÚNICO: | 2468464 | TIPO DE INVERSIÓN: | PROYECTO DE INVERSION |
| NOMBRE DE LA INVERSIÓN: | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL BERNALES DEL DISTRITO DE HUMAY - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA | MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA |
| OPMI: | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL ICA | REGISTRO DE CIERRE: | NO |
| UEI: | DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA | PMI AÑO 1 <2024> | 0 |
| | | PMI AÑO 2 <2025> | 0 |
| | | PMI AÑO 3 <2026> | 0 |

2. FOTOGRAFÍAS

3. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN

FECHA DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

INICIO: 15/01/2023

CULMINACIÓN: 15/04/2023

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN (i)

1.8%

AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA INVERSIÓN (i)

0%

Fecha de declaración: 15/03/2023

VER DETALLE DEL AVANCE:

VARIACIONES DEL COSTO ACTUALIZADO (\$/ MM)

DECLARACIÓN DE VIABILIDAD

3.8 MM

NOV-2019

| Variación | Porcentaje (%) |
|--------------------------|----------------|
| Respecto a la viabilidad | 0% (\$/ 0 MM) |

SITUACIÓN

[13/12/2023] MEDIANTE LA ORDEN DE SERVICIO N°000864-2023 SE CONTRATO LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA O EMPRESA CONSULTORA QUE ELABORE EL ESTUDIO DE EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR INICIANDO SUS ACTIVIDADES EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023. ESTE ESTUDIO ES NECESARIO PARA OBTENER LA CERTIFICACION AMBIENTAL PARA EL INICIO DE LA EJECUCION CONTRACTUAL DEL PROYECTO.


PROBLEMÁTICA - RIESGO EN LA FASE DE EJECUCIÓN

4. EJECUCIÓN FINANCIERA


AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE LA INVERSIÓN

| | |
|--|--------------|
| COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO: | S/ 4,473,406 |
| DEVENGADO ACUMULADO: | S/ 80,000 |
| PRIMER DEVENGADO: | JUN-2022 |
| ULTIMO DEVENGADO: | AGO-2022 |

% DE AVANCE ACUMULADO




HISTÓRICO DEL DEVENGADO DE LA INVERSIÓN (S/ MM)

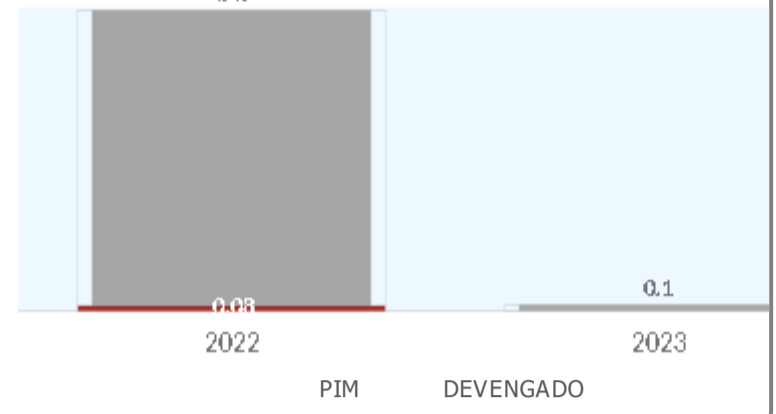


AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSIÓN 2023

| | |
|--|---------------|
| PIM 2023 (a): | S/ 100,000 |
| DEVENGADO 2023 : | S/ 0 |
| PROGRAMACION FINANCIERA ACTUALIZADA (b): | S/ 4,393,406 |
| DEFICIT O SALDO (a-b): | S/ -4,293,406 |

% DE AVANCE PIM 2023



PROGRAMACIÓN FINANCIERA ACUMULADA (S/ MM)

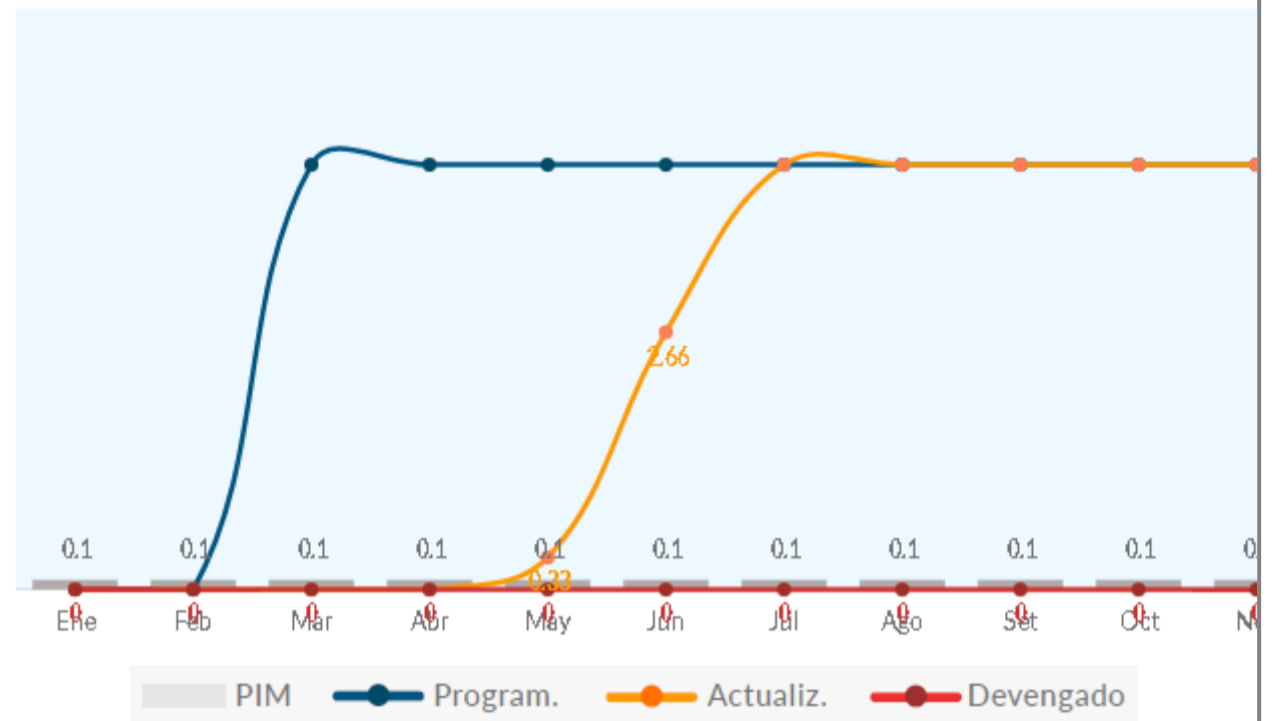

EJECUCIÓN FINANCIERA 2023 (S/)

| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Total |
|---------------------------|-----|-----|-----------|-----|---------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| Prog. Financ. Inicial | - | - | 4,393,407 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,393,407 |
| Prog. Financ. Actualizada | - | - | - | - | 325,345 | 2,334,548 | 1,733,513 | - | - | - | - | - | 4,393,406 |
| Devengado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

ENLACES DE INTERES:

