



REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL FORMATO N° 12-B

SECCIONES DEL FORMATO N° 12-B:



1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN

CÓDIGO ÚNICO:	2355763	TIPO DE INVERSIÓN:	PROYECTO DE INVERSION
NOMBRE DE LA INVERSIÓN:	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LAS CUENCAS ALTAS DE LOS RÍOS YAUCA, TINGUE Y SANTA CRUZ, EN LOS DISTRITOS DE YAUCA DEL ROSARIO Y TIBILLO II ETAPA - PROVINCIAS DE ICA Y PALPA - REGIÓN ICA. LAS PROVINCIAS DE ICA Y PALPA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
OPMI:	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL ICA	REGISTRO DE CIERRE:	NO
UEI:	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA	PMI AÑO 1 <2025>	6,777,394
		PMI AÑO 2 <2026>	0
		PMI AÑO 3 <2027>	0

2. FOTOGRAFÍAS



ENE-2024



DIC-2023

3. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN

FECHA DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

INICIO:

15/06/2021

CULMINACIÓN:

14/06/2024

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN (i)

31.4%

Fecha de declaración: 13/02/2024

VER DETALLE DEL AVANCE:

AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA INVERSIÓN (i)

34.4%

VARIACIONES DEL COSTO ACTUALIZADO (S/ MM)

DECLARACIÓN DE VIABILIDAD

22.3 MM

OCT-2018

APROBACIÓN DEL 1er ET/DE

23.8 MM

MAY-2021

ÚLTIMA MODIFICACIÓN

32.6 MM

JUL-2023

Variación

Respecto a la viabilidad

Porcentaje (%)

46% (S/ 10.3 MM)

SITUACIÓN

[13/02/2024] obra se encuentra ATRASADA con un porcentaje del -1.68% teniendo un avance acumulado ejecutado al 37.88% y programado en un 39.56%, dentro de las actividades realizadas durante el mes de enero tenemos: procesos pendientes: INSTALACION DE GEOMEMBRANA Y GEOTEXTIL - proveedor solicita suspension de plazo debido a las dificultades climatologicas que presenta el sector. COMPONENTE PLANTONES FORESTALES y viveros: se continúa efectuando labores en los 02 viveros Curis y Tibillo.

PROBLEMÁTICA - RIESGO EN LA FASE DE EJECUCIÓN

Etapas ET/DE:

11/05/2023: OTROS

Etapa Proceso de ejecución física:

2021-10: DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

4. EJECUCIÓN FINANCIERA

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE LA INVERSIÓN

COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN

S/

ACTUALIZADO:

32,612,149

DEVENGADO ACUMULADO:

S/

13,093,766

PRIMER DEVENGADO:

FEB-2021

ULTIMO DEVENGADO:

DIC-2023

% DE AVANCE ACUMULADO

40.1%

HISTÓRICO DEL DEVENGADO DE LA INVERSIÓN (S/ MM)

2021

1.15

0.79

2022

8.36

8.07

2023

4.92

4.24

2024

3.4


PIM

DEVENGADO


AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSIÓN 2024

PIM 2024 (a):	S/ 3,427,751
DEVENGADO 2024 :	S/ 0
PROGRAMACION FINANCIERA ACTUALIZADA (b):	S/ 10,000,000
DEFICIT O SALDO (a-b):	S/ -6,572,249

% DE AVANCE PIM 2024

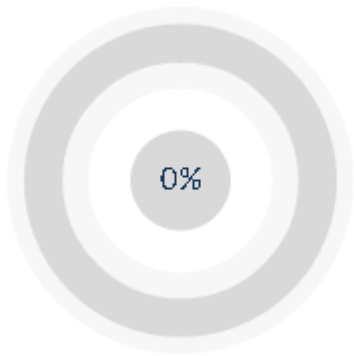

PROGRAMACIÓN FINANCIERA ACUMULADA (S/ MM)

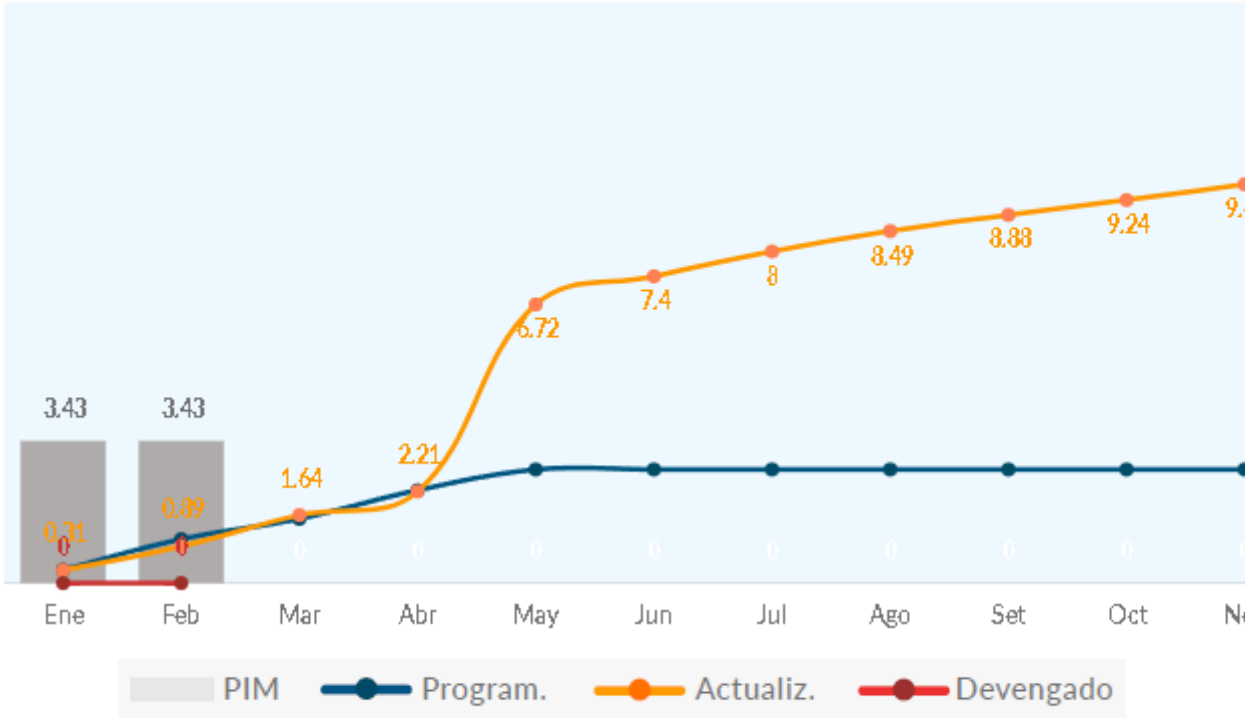

EJECUCIÓN FINANCIERA 2024 (S/)														
Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total	
Prog. Financ. Inicial	319,481	737,039	489,772	693,901	500,796	-	-	-	-	-	-	-	2,740,989	
Prog. Financ. Actualizada	309,398	580,230	746,295	570,490	4,514,077	681,749	600,924	484,231	396,606	354,256	379,356	382,388	10,000,000	
Devengado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	

ENLACES DE INTERES:

