



REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL FORMATO N° 12-B

SECCIONES DEL FORMATO N° 12-B:



1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN

CÓDIGO ÚNICO:	2086791	TIPO DE INVERSIÓN:	PROYECTO DE INVERSION
NOMBRE DE LA INVERSIÓN:	RECONSTRUCCION DEL LOCAL DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ICA SEDE CENTRAL, DE LA REGION ICA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
OPMI:	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL ICA	REGISTRO DE CIERRE:	NO
UEI:	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA	PMI AÑO 1 <2025>	0
		PMI AÑO 2 <2026>	0
		PMI AÑO 3 <2027>	0


2. FOTOGRAFÍAS

3. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN

FECHA DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

INICIO:	20/10/2017
CULMINACIÓN:	19/11/2018


AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN (i)

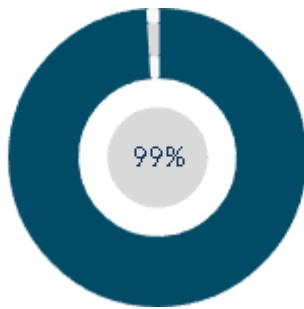


Fecha de declaración: 15/03/2023

VER DETALLE DEL AVANCE:

AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA INVERSIÓN (i)

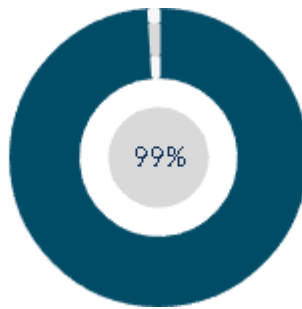

VARIACIONES DEL COSTO ACTUALIZADO (\$/ MM)

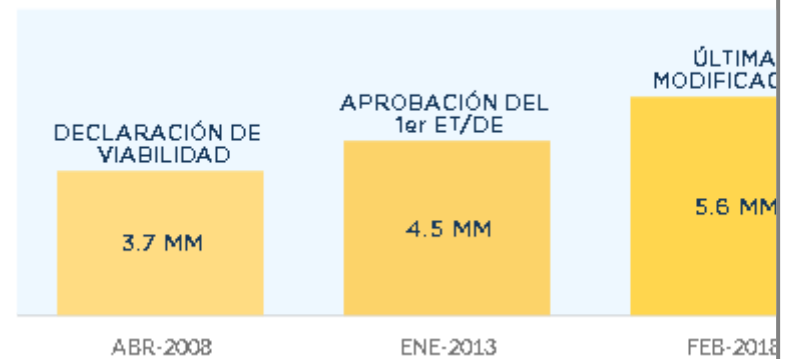

Variación	Porcentaje (%)
Respecto a la viabilidad	51% (\$/ 1.9 MM)

SITUACIÓN

[02/04/2024] SE CUMPLIO CON LA EJECUCION DE LA INVERSION DEL PROYECTO, QUE TENIA UN SALDO DE 25,163.00 PARA CULMINAR IMPLEMENTAR O REALIZAR MEJORAS EN EL LOCAL INSTITUCIONAL



PROBLEMÁTICA - RIESGO EN LA FASE DE EJECUCIÓN

Etapas ET/DE:
[01/02/2022: AMPLIACIONES DE PLAZO](#)



4. EJECUCIÓN FINANCIERA

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE LA INVERSIÓN

