



REPORTE DE SEGUIMIENTO
A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL
FORMATQ N° 12-B

SECCIONES DEL FORMATO N° 12-B:



1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN

CÓDIGO ÚNICO:	2607725	TIPO DE INVERSIÓN:	IOARR
NOMBRE DE LA INVERSIÓN:	REPARACION DE TALUD/ MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) CANAL LA ACHIRANA DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR LA ACHIRANA - CLASE B EN LA LOCALIDAD SANTA BARBARA, DISTRITO DE LA TINGUIÑA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
OPMI:	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL ICA	REGISTRO DE CIERRE:	Sí, en proceso de liquidación
UEI:	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA	PMI AÑO 1 <2025>	0
		PMI AÑO 2 <2026>	0
		PMI AÑO 3 <2027>	0

2. FOTOGRAFÍAS



NOV-2023



DIC-2023

3. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN

FECHA DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		VARIACIONES DEL COSTO ACTUALIZADO (\$/ MM)		
INICIO:	15/11/2023	DECLARACIÓN DE VIABILIDAD	APROBACIÓN DEL 1er ET/DE	ÚLTIMA MODIFICACIÓN
CULMINACIÓN:	20/12/2023	0.9 MM	0.9 MM	0.9 MM
AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN (i)	AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA INVERSIÓN (i)	AGO-2023	AGO-2023	AGO-2023
100%	100%	Variación	Porcentaje (%)	
		Respecto a la viabilidad	0% (\$/ 0 MM)	

SITUACIÓN

[05/06/2024] MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N°064-2024-GORE-ICA-DRA PUBLICADO EL 15 DE FEBRERO DEL 2024 SE APROBO LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DEL CONTRATO N°066-2023-GORE-ICA-DRA CON UNA INVERSION EJECUTADA DE S/. 796,500.00, POSTERIORMENTE SE PROCEDIO A INICIAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE PARA LA TRASFERENCIA DE LA INFRAESTRUTURA Y LOS OTROS COMPONENTES DE LA OBRA PARA DAR LA RESPONSABILIDAD A LA JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR LA ACHIRANA CLASE B.



PROBLEMÁTICA - RIESGO EN LA FASE DE EJECUCIÓN


No se encontraron problemas.

4. EJECUCIÓN FINANCIERA


AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE LA INVERSIÓN

COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO:	S/ 940,899
DEVENGADO ACUMULADO:	S/ 810,500
PRIMER DEVENGADO:	DIC-2023
ULTIMO DEVENGADO:	DIC-2023

% DE AVANCE ACUMULADO

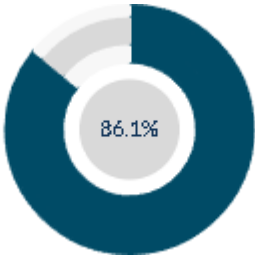


HISTÓRICO DEL DEVENGADO DE LA INVERSIÓN (S/ MM)

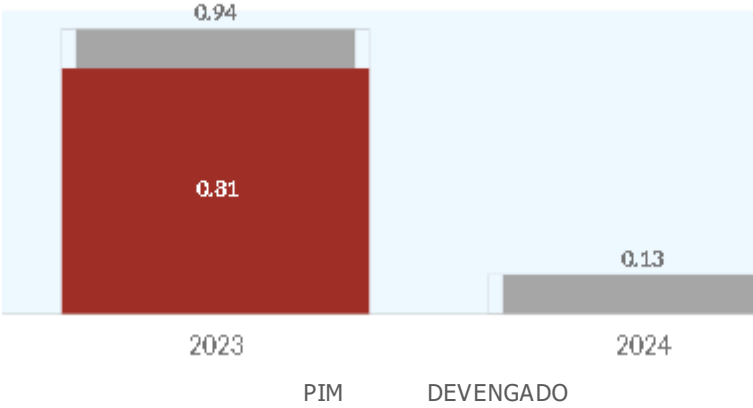


AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSIÓN 2024

PIM 2024 (a):	S/ 130,390
DEVENGADO 2024 :	S/ 0
PROGRAMACION FINANCIERA ACTUALIZADA (b):	S/ 130,390
DEFICIT O SALDO (a-b):	S/ 0

% DE AVANCE PIM 2024



PROGRAMACIÓN FINANCIERA ACUMULADA (S/ MM)

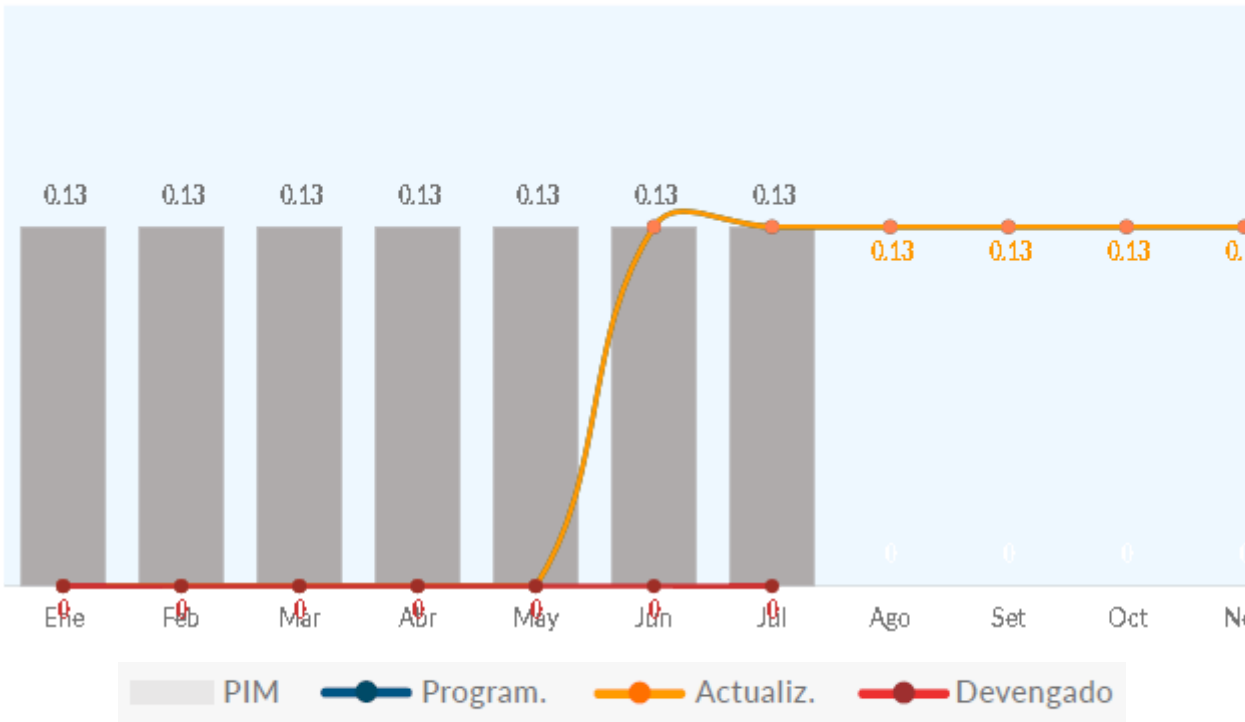

EJECUCIÓN FINANCIERA 2024 (S/)

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
Prog. Financ. Inicial	-	-	-	-	-	130,390	-	-	-	-	-	-	130,390
Prog. Financ. Actualizada	-	-	-	-	-	130,390	-	-	-	-	-	-	130,390
Devengado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

ENLACES DE INTERES:

