



REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL FORMATQ N° 12-B

SECCIONES DEL FORMATO N° 12-B:



1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN

CÓDIGO ÚNICO:	2307484	TIPO DE INVERSIÓN:	PROYECTO DE INVERSION
NOMBRE DE LA INVERSIÓN:	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HÍDRICA EN LAS MICRO CUENCAS DEL RIO SAN JUAN , EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE YANAC, CHAVIN, SAN PEDRO DE HUACARPANA Y HUANCANO, PROVINCIAS DE CHINCHA Y PISCO - REGION ICA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
OPMI:	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL ICA	REGISTRO DE CIERRE:	NO
UEI:	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA	PMI AÑO 1 <2025>	0
		PMI AÑO 2 <2026>	0
		PMI AÑO 3 <2027>	0

2. FOTOGRAFÍAS



JUN-2022




SET-2022

3. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN


FECHA DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

INICIO:	01/08/2018
CULMINACIÓN:	31/05/2023

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN (i)

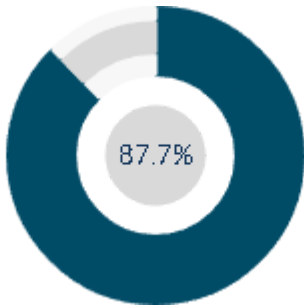


AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA INVERSIÓN (i)

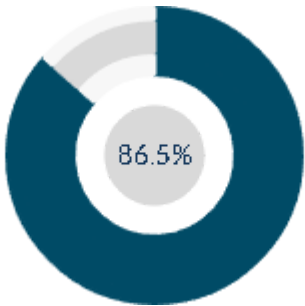

Fecha de declaración: 15/03/2023

VER DETALLE DEL AVANCE:

VARIACIONES DEL COSTO ACTUALIZADO (\$/ MM)

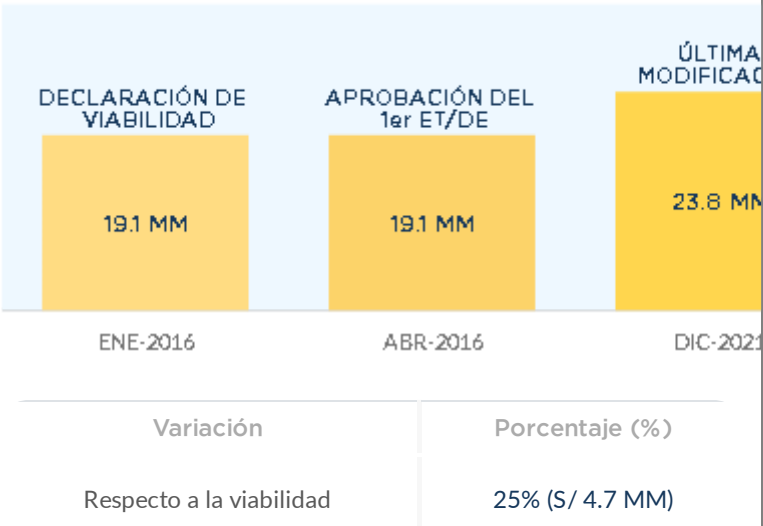

SITUACIÓN

[08/07/2024] MEDIANTE INFORME N° 088-2024-GORE.ICA-DRA-EIA/CGP/CJAV SE REMITIO LA SITUACION DEL PROYECTO, MENCIONANDO QUE SE CUMPLIO LA FECHA DE TERMINO DE EJECUCION EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2022, QUEDANDO PENDIENTE EL CUMPLIMIENTO DE METAS A NIVEL DE PROYECTO, PERO QUE NO SE ENCUENTRA EN ESTADO DE PARALIZACION. ADEMAS SE A SOLICITADO ASIGNACION PRESUPUESTAL DEL SALDO DE EJECUCION DE OBRA PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ELABORACION DEL INFORME TECNICO DE CORTE DE OBRA Y ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA, CON EL FIN DE PODER CONOCER EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PROYECTADAS SEGUN EXPEDIENTE TECNICO.



PROBLEMÁTICA - RIESGO EN LA FASE DE EJECUCIÓN


[2022-03] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES)

4. EJECUCIÓN FINANCIERA


AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE LA INVERSIÓN

COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN	S/
ACTUALIZADO:	23,815,039
DEVENGADO ACUMULADO:	S/
	23,061,787
PRIMER DEVENGADO:	AGO-2018
ULTIMO DEVENGADO:	NOV-2023

% DE AVANCE ACUMULADO

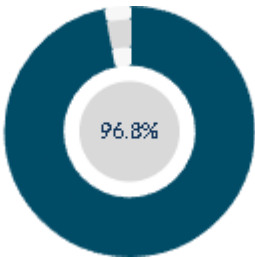

HISTÓRICO DEL DEVENGADO DE LA INVERSIÓN (S/ MM)

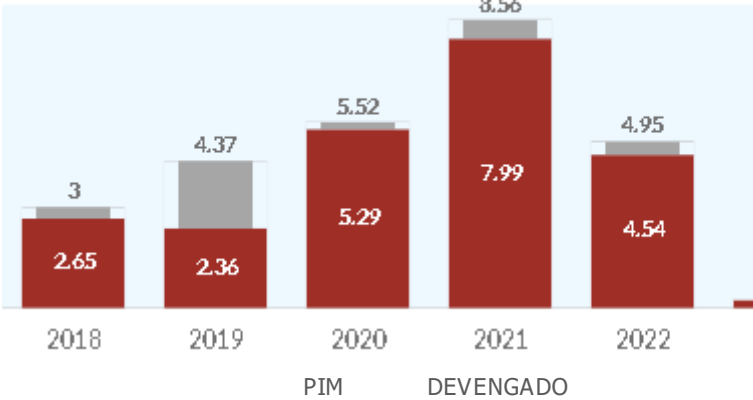


AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSIÓN 2024

PIM 2024 (a):	S/ 0
DEVENGADO 2024 :	S/ 0
PROGRAMACION FINANCIERA ACTUALIZADA (b):	S/ 753,252
DEFICIT O SALDO (a-b):	S/ -753,252

% DE AVANCE PIM 2024

NaN%

PROGRAMACIÓN FINANCIERA ACUMULADA (S/ MM)

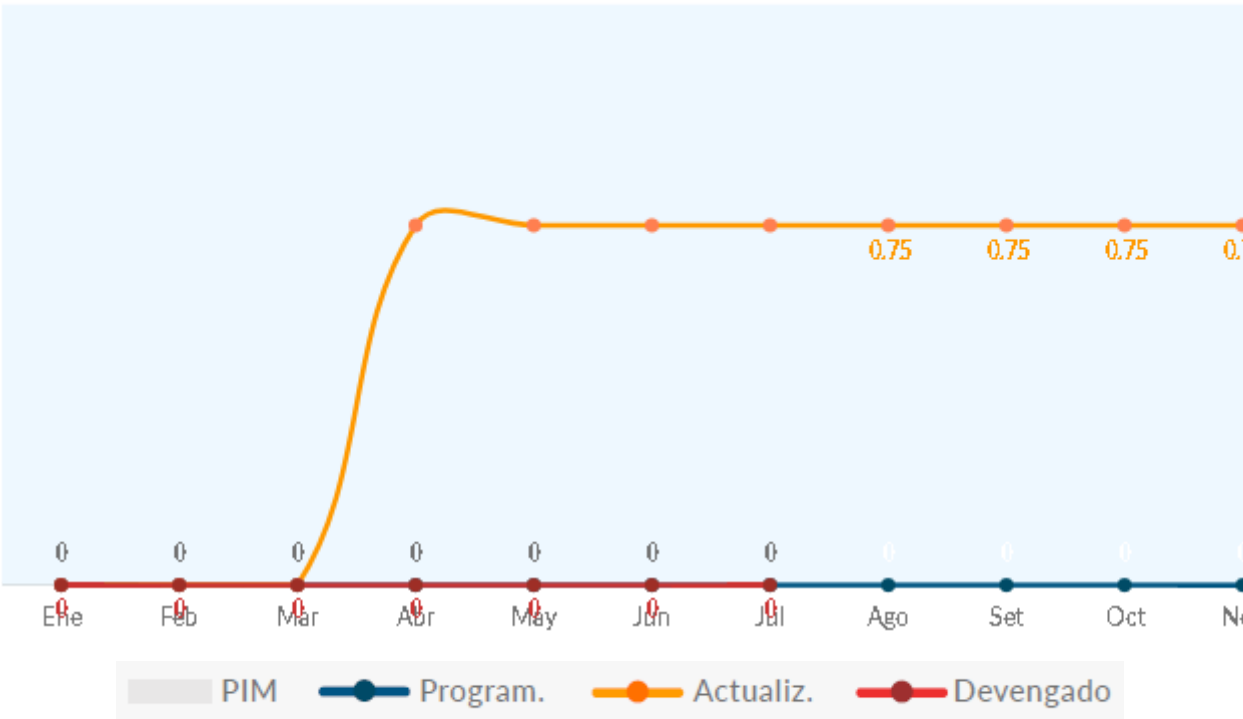

EJECUCIÓN FINANCIERA 2024 (S/)

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
Prog. Financ. Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Prog. Financ. Actualizada	-	-	-	753,252	-	-	-	-	-	-	-	-	753,252
Devengado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

ENLACES DE INTERES:

