



REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL **FORMATO N° 12-B**

SECCIONES DEL FORMATO N° 12-B:



1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN

CÓDIGO ÚNICO:	2307484	TIPO DE INVERSIÓN:	PROYECTO DE INVERSION
NOMBRE DE LA INVERSIÓN:	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HÍDRICA EN LAS MICRO CUENCAS DEL RIO SAN JUAN , EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE YANAC, CHAVIN, SAN PEDRO DE HUACARPANA Y HUANCANO, PROVINCIAS DE CHINCHA Y PISCO - REGION ICA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
OPMI:	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL ICA	REGISTRO DE CIERRE:	NO
UEI:	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA	PMI AÑO 1 <2024>	0
		PMI AÑO 2 <2025>	571,060
		PMI AÑO 3 <2026>	0

2. FOTOGRAFÍAS



JUN-2022



SET-2022


3. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN

FECHA DE LA EJECUCIÓN FÍSICA


INICIO: 01/08/2018

CULMINACIÓN: 31/05/2023

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN (i)

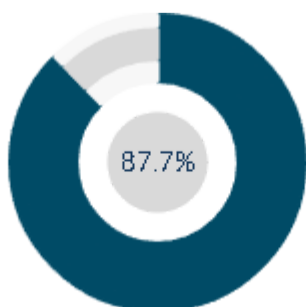


AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA INVERSIÓN (i)

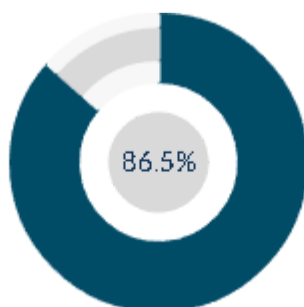

Fecha de declaración: 15/03/2023

VER DETALLE DEL AVANCE:

VARIACIONES DEL COSTO ACTUALIZADO (S/ MM)

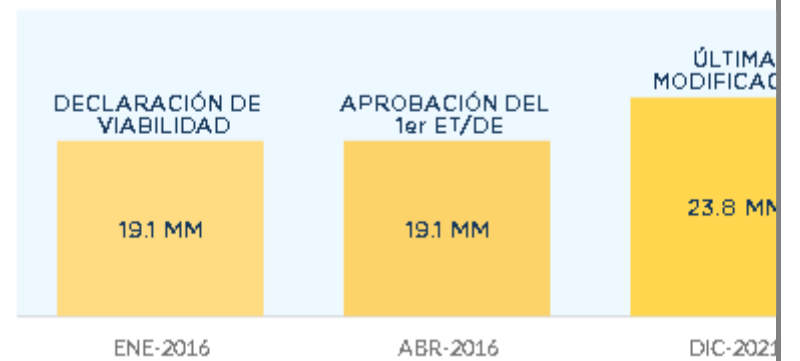

Variación	Porcentaje (%)
Respecto a la viabilidad	25% (S/ 4.7 MM)

SITUACIÓN

[07/11/2023] LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE PLANTACION FORESTAL SE A DESARROLLADO CON BASE AL CRONOGRAMA DE EJECUCION MODIFICADO EN LA DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA Y SERVICIOS REQUERIDOS. EL AVANCE FISICO EJECUTADO EN EL PERIODO DEL MES DE SETIEMBRE ES DE 48.70% FRENTE AL 48.84% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO. CON BASE A LO ANTERIOR. LAS ACTIVIDADES DE PLANTACION FORESTAL SE ENCUENTRAN EN UN ESTADO AL DIA, DEBIDO A QUE LA DIFERNCIA DE PORCENTAJES SE DEBE A UN COSTO MENOR EN LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO. ADEMÁS SE INFORMA QUE LAS ACTIVIDADES DE PLANTACION FORESTAL PRESENTA UN AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO DEL 94. 85% DEL TOTAL DEL PROYECTADO, PERO QUE ESTE PORCENTAJE REPRESENTA AL 100% DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE PLANTONES DE PINO RADIATA DISPONIBLES EN EL VIVERO DE UTAPALCA A MOMENTO DE INICIADAS LAS ACTIVIDADES. SE CONCLUYE QUE SE DAN POR TERMINADAS LAS ACTIVIDADES DE PLANTACION FORESTAL




PROBLEMÁTICA - RIESGO EN LA FASE DE EJECUCIÓN


[2022-03] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES)

4. EJECUCIÓN FINANCIERA

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE LA INVERSIÓN

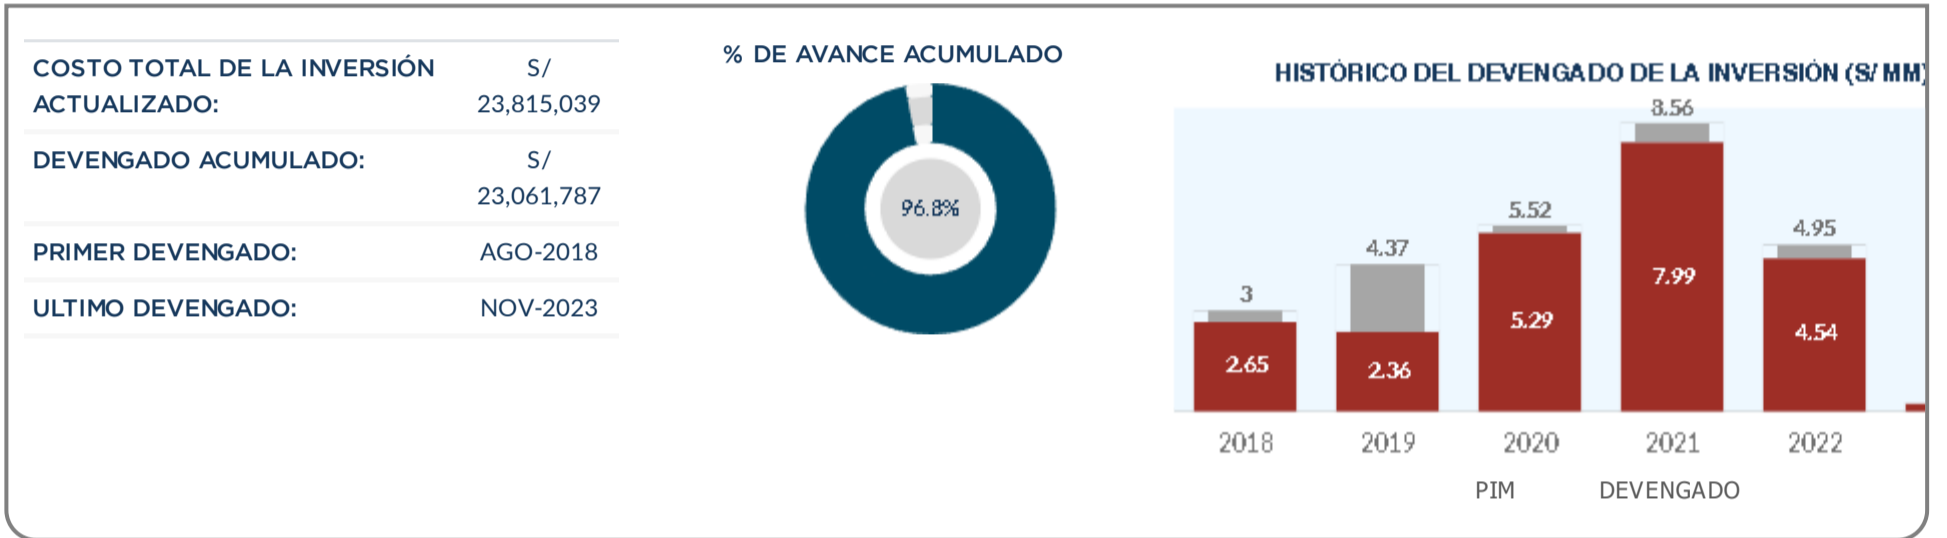

AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSIÓN 2023

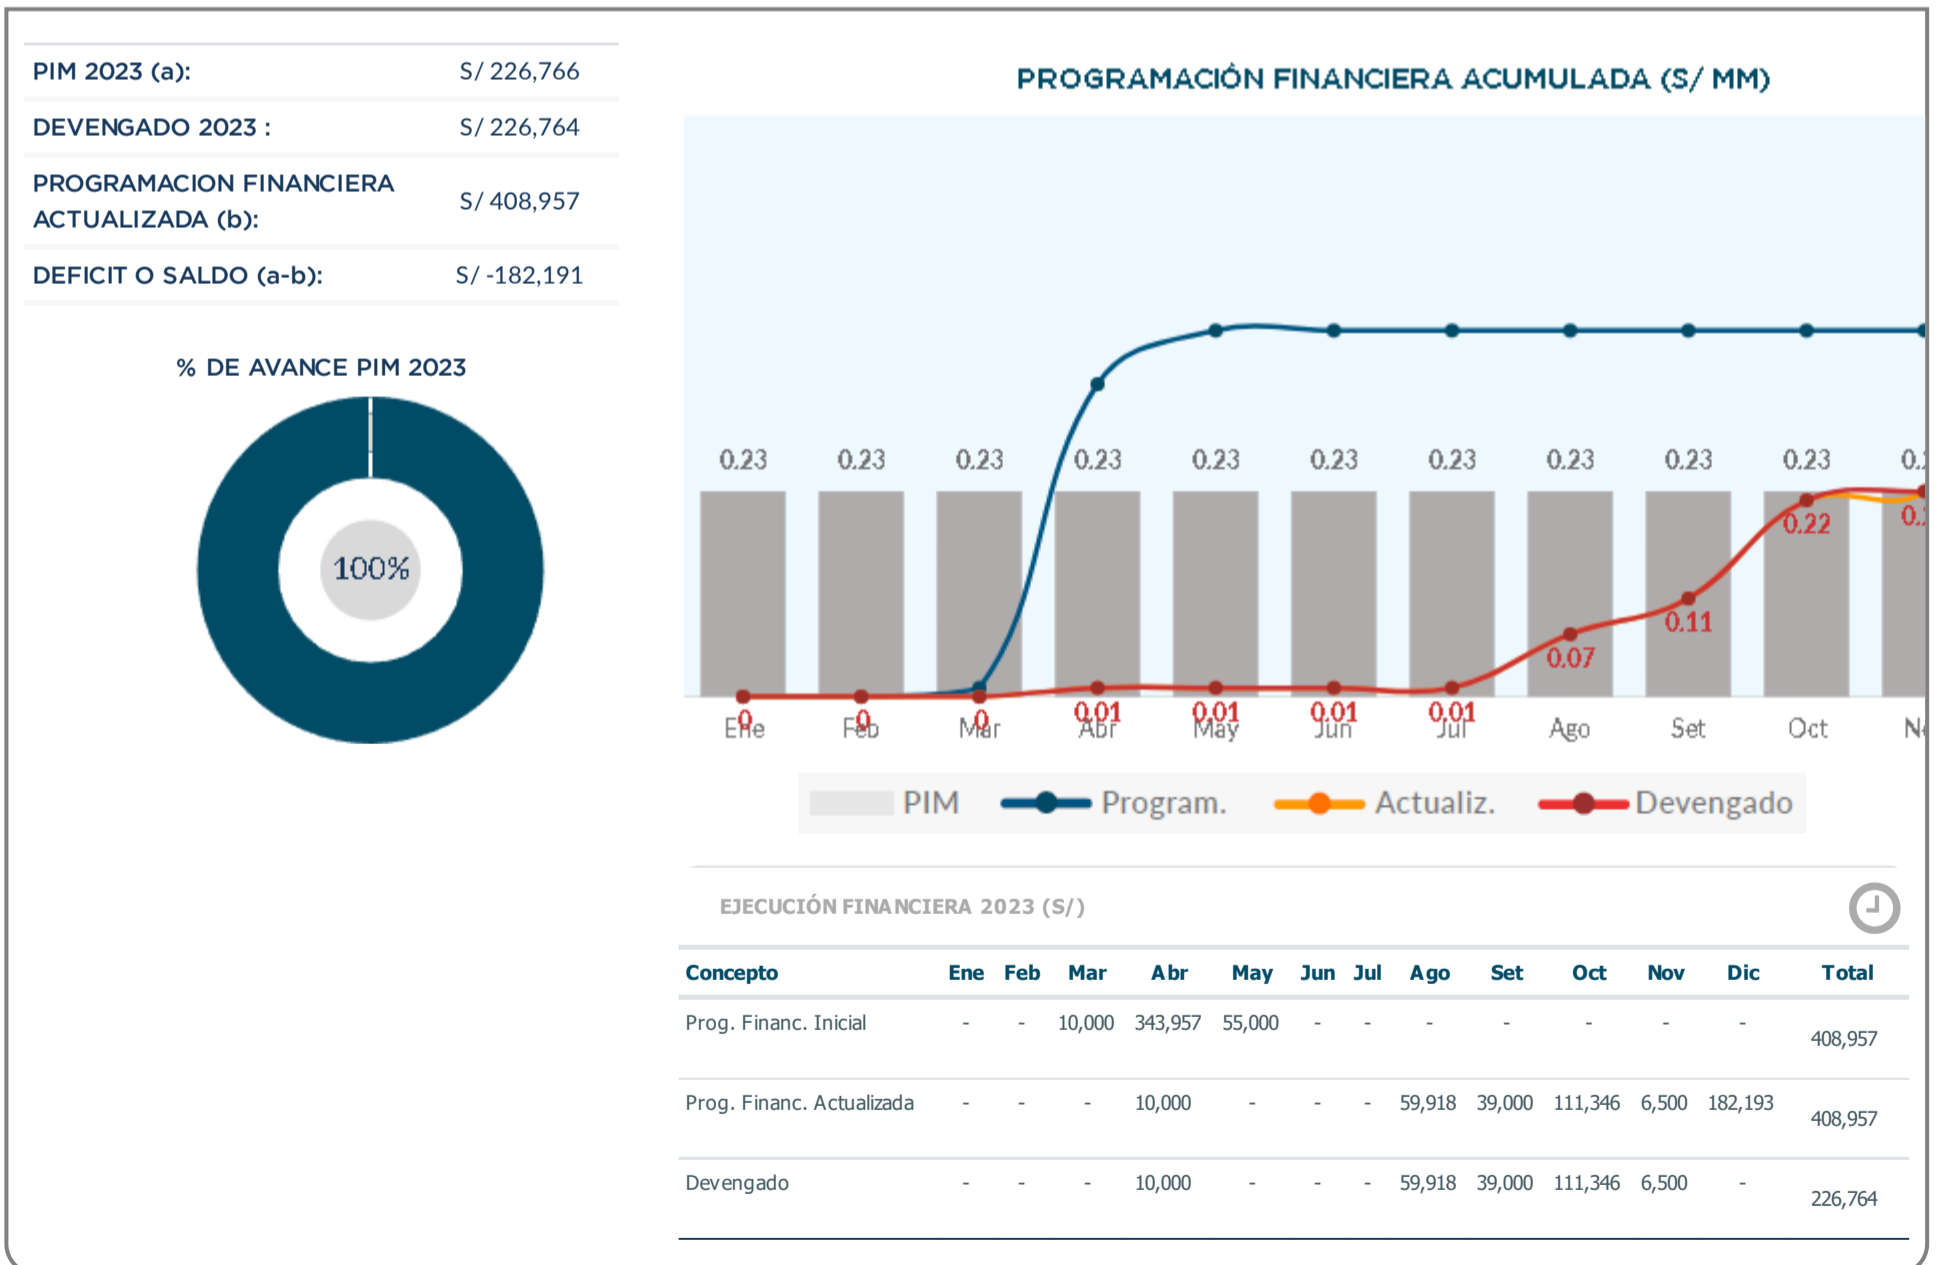

ENLACES DE INTERES:

