



REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL FORMATO N° 12-B

SECCIONES DEL FORMATO N° 12-B:



1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN

CÓDIGO ÚNICO:	2468464	TIPO DE INVERSIÓN:	PROYECTO DE INVERSION
NOMBRE DE LA INVERSIÓN:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL BERNALES DEL DISTRITO DE HUMAY - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
OPMI:	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL ICA	REGISTRO DE CIERRE:	NO
UEI:	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA	PMI AÑO 1 <2025>	4,293,406
		PMI AÑO 2 <2026>	0
		PMI AÑO 3 <2027>	0

2. FOTOGRAFÍAS

3. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN

FECHA DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

INICIO:

15/01/2023

CULMINACIÓN:

15/04/2023

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN (i)

1.8%

Fecha de declaración: 15/05/2024

VER DETALLE DEL AVANCE:

AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA INVERSIÓN (i)

0%

VARIACIONES DEL COSTO ACTUALIZADO (\$/ MM)

DECLARACIÓN DE VIABILIDAD

3.8 MM

NOV-2019

APROBACIÓN DEL 1er ET/DE

4.5 MM

AGO-2022

ÚLTIMA MODIFICACIÓN

4.5 MM

AGO-2022

Variación

Respecto a la viabilidad

Porcentaje (%)

17% (\$/ 0.7 MM)


SITUACIÓN

[09/07/2024] mediante oficio n°0635-2024-gore-ica-grde/dra LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ICA PRESENTO UNA SOLICITUD DE ACOGIMIENTO PARA LA ADECUACION AMBIENTAL DE ACTIVIDAD SECTOR AGRARIO Y DE RIEGO, PROYECTO CON CUI 2468464

PROBLEMÁTICA - RIESGO EN LA FASE DE EJECUCIÓN

4. EJECUCIÓN FINANCIERA

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE LA INVERSIÓN

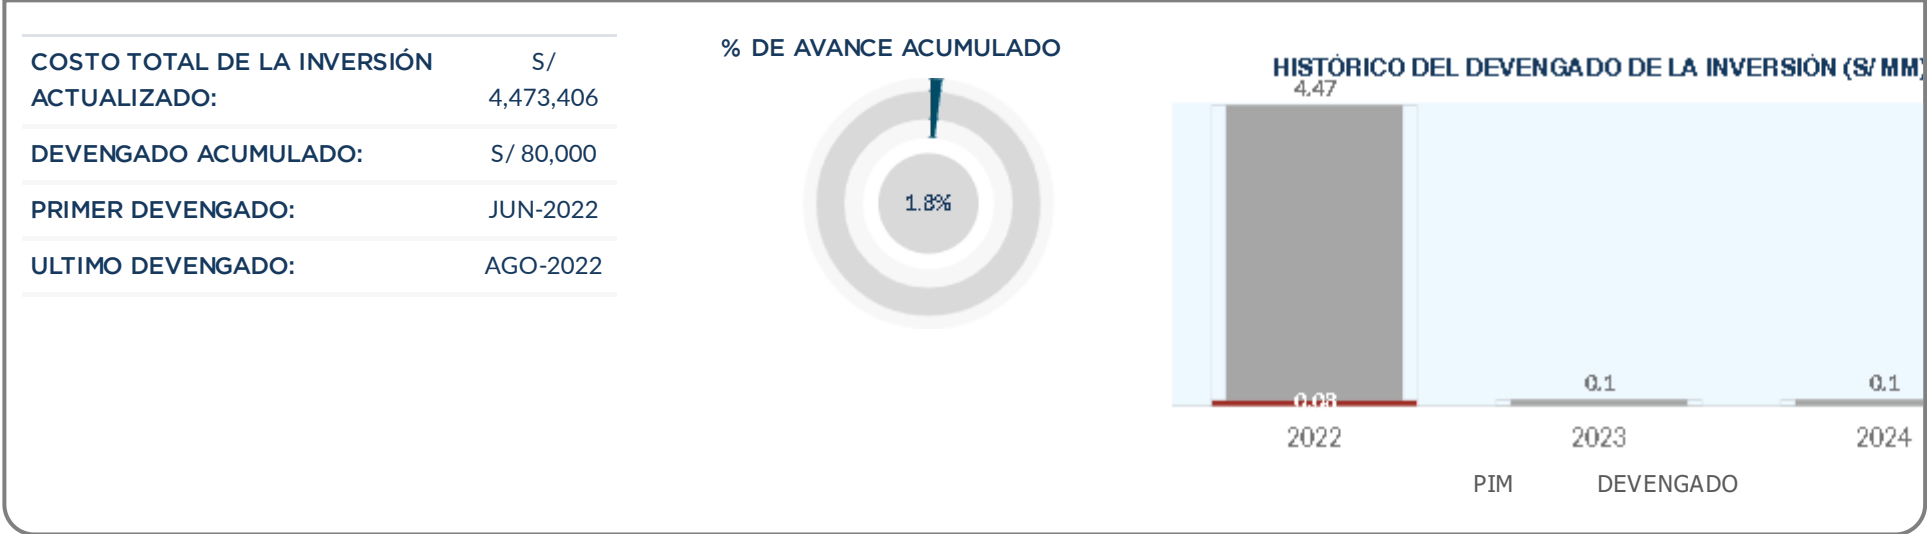

AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSIÓN 2024



ENLACES DE INTERES:

